
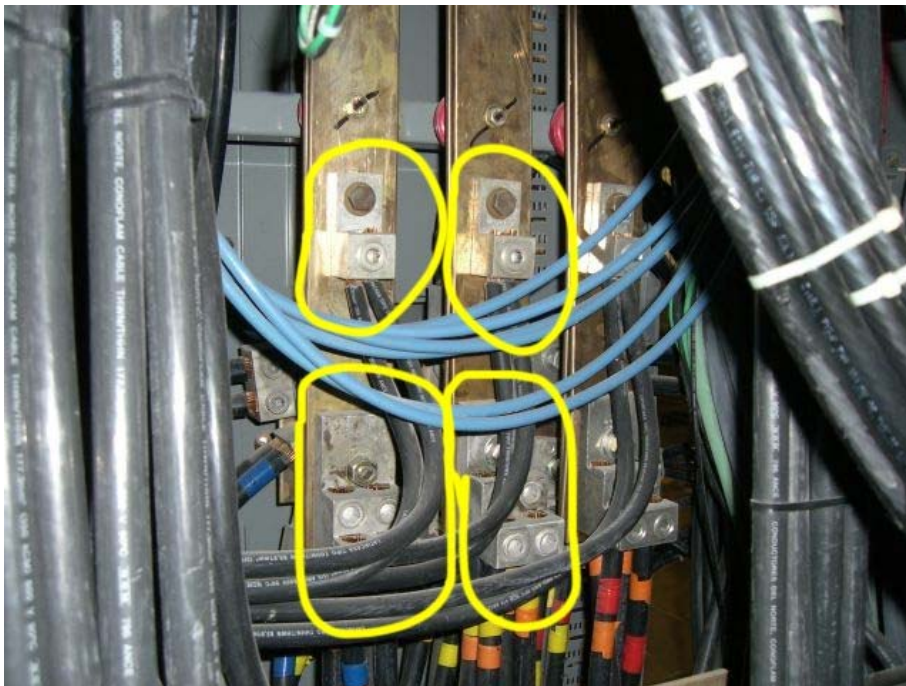


Empresa: Invensys Reynosa Planta 2

Elemento inspeccionado: Sub estacion principal. Tablero general S-1

Análisis y recomendaciones: Sobrecalentamiento en acometida a barras del tablero. Fase L1 y L3. Desarmar, limpiar y reapretar conexiones.

Inspeccionado por: Ing. Fernando Castillo

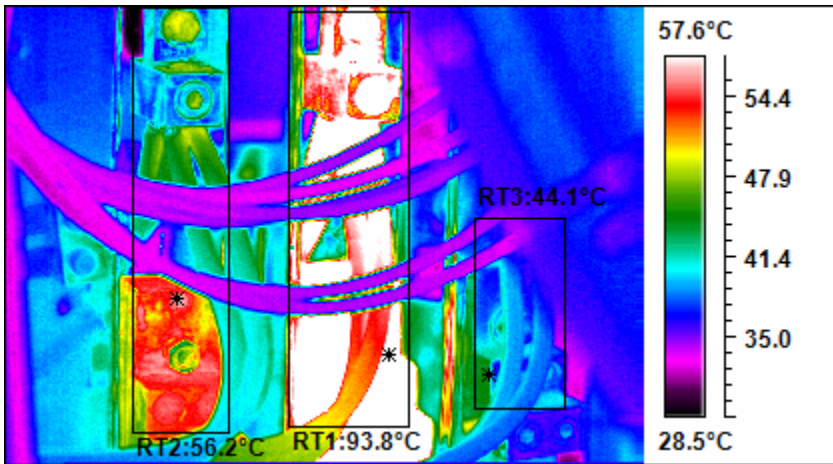

Object Parameter	Value
RT1:AvgTemp	55.0°C
RT1:MaxTemp	93.8°C
RT1:MinTemp	31.4°C
RT2:AvgTemp	43.8°C
RT2:MaxTemp	56.2°C
RT2:MinTemp	28.6°C
RT3:AvgTemp	37.8°C
RT3:MaxTemp	44.1°C
RT3:MinTemp	33.3°C
